

당리동 샛별지하공영주차장 조성

《추진배경 혹은 목적》

- 당리동 샛별공원 일원은 단독주택으로 주차장 부족하고 이면도로 불법주차 만연
- 주택밀집지역의 주차난 해소를 통하여 생활환경 개선 및 주민 만족도 제고

■ 사업개요

- 위 치 : 당리동 348-6 (샛별공원)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 3,480백만원(국 1,250 시 500 구 1,730)
- 사업내용 : 당리동 샛별 공원 지하주차장 건설 및 상부 공원 재조성

■ 추진상황

- 2018. 1. : 주차환경개선지구로 지정·고시 (당리동 2블록)
- 2018. 8. : 지방재정투자심사(자체) 심의
- 2018. 11. : 공유재산심의회 심의
- 2019. 5. : 도시계획시설 결정 관련 주민설명회 개최
- 2019. 7. : 도시계획시설결정 용역 완료 및 지형도면 고시
- 2020. 4. : 도시계획시설(주차장) 결정용역 완료 후 2020년 총선까지 사업 중단
- 2020. 7. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 9. : 주민설명회 개최 (구의원 및 당리동·괴정4동 주민 49명)
- 2020. 12. : 건축공사 착공
- 2021. 2. : 공원공사 착공 (수목 이식)
- 2021. 3. : 공원공사 일시정지 및 건축공사 재개
- 2021. 5. : 사업계획 변경 (사업비 구비 600백만원 증액)
- 2021. 6. : 건축공사 일시정지(6.1.) 및 재개(6.9.) ▸철근수급 불안
- 2021. 8. : 건축공사 일시정지(8.12.) ▸철근수급 불안
사업계획 변경 (사업비 구비 180백만원 증액)


- 2021. 9. : 건축공사 재개(9.24.) ▶철근수급 완료
- 2021. 11. : 공원공사 재개(11.15.) 및 건축공사 준공(11.25.)
- 2021. 12. ~ 2022. 2. : 공원공사 일시정지 ※ 휴한기(12~2월) 수목식재 불가
- 2022. 4. : 공원공사 준공
- 2022. 6. : 주차장 직영 운영 개시(6.1.) 준공식(6.17.)

■ 기대효과

- 대규모 공영주차장 조성으로 주택가 주차난 해소에 기여
- 당리·사하중학교 인근 불법주정차 근절, 안전한 통학로 확보
- 상부 셋별공원 재조성 시 설계에 주민의견(수목, 시설물 등)을 반영, 한층 쾌적한 휴식공간 제공

□ 사업명 : 당리동 셋별 지하공영주차장 조성

《 위치도 》

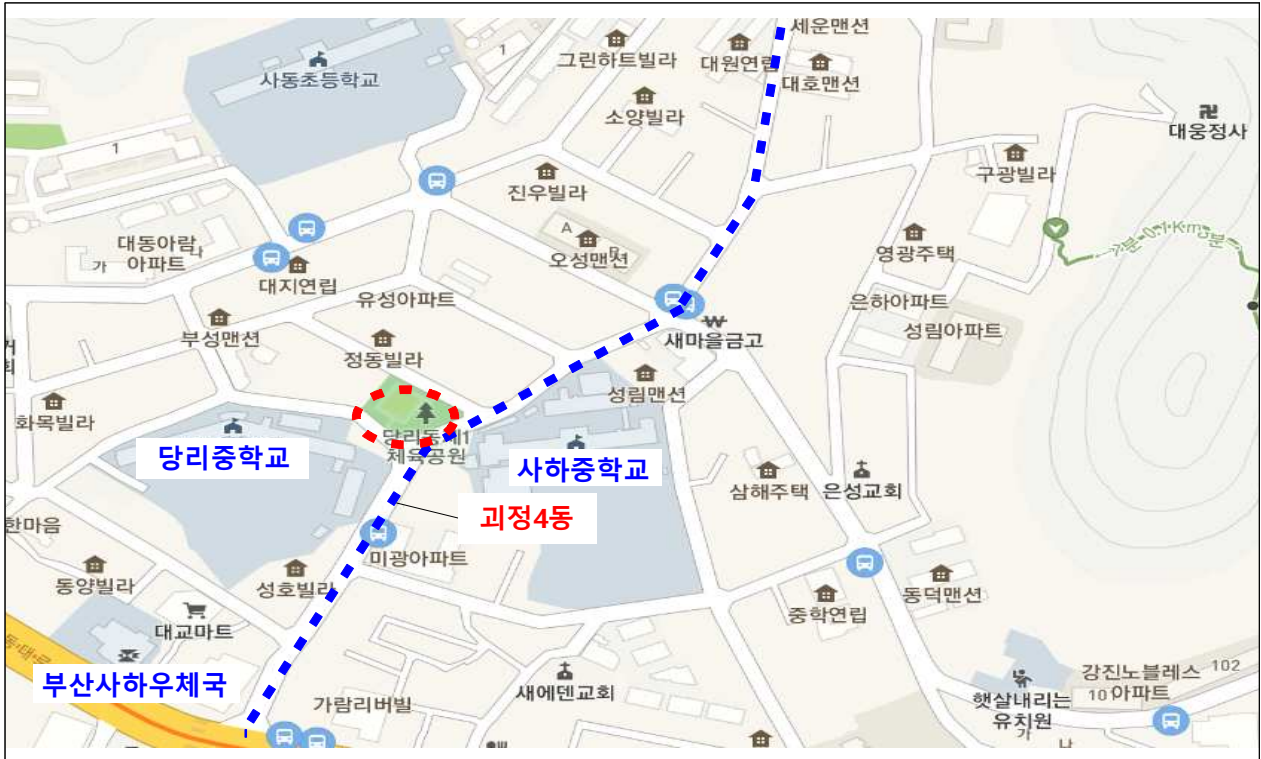

《 현장 사진 》

